

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL –
MDR.

PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9º
MEDIÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS – I -
OGU.

CONTRATO DE REPASSE OGU Nº. 1074849-
56/2020/MIDR/CAIXA

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
TERRITORIAL E URBANO.

OBJETO:EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ESTRADA
VICINAIS, COM PEDRAS IRREGULARES -
POLIÉDRICA

VALOR MEDIDO: R\$ 119.811,00

VALORES MEDIDOS ACUMULADOS: R\$ 1.212.811,67

Empresa: Valdeci Rodrigues Simão

Nº OPERAÇÃO 26094/2020	Nº SICONV 909303/2020	PROPONENTE TOMADOR CEF	APELIDO EMPREENDIMENTO Execução de Pavimentação de Estradas Vicinais	NOME DA EMPRESA 0
---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------

Medição: **11** Período: **12/04/2025 a 11/08/2025** % Realizado Período.: **5,23%** % Realizado Acum.: **52,94%**

Trecho 1	Trecho 2	Trecho 3	Trecho 4	Trecho 5	Trecho 6	Trecho 7	Trecho 8	Trecho 9	Trecho 10	Trecho 11	Trecho 12	Trecho 13	Trecho 14	Trecho 15	Trecho 16	Trecho 17	Trecho 18	Trecho 19	Trecho 20	21	22	23
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11												
1																						

Nº do Evento	Título dos Eventos
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	TERRAPLANAGEM
4	PAVIMENTACAO
5	CONTENCAO
6	SERVIÇOS EXECUTADOS E PAGOS

Medições	Data das Medições																					
	28/07/2022	28/07/2022	14/12/2023	02/02/2024	11/03/2024	24/05/2024	10/07/2024	17/09/2024	11/11/2024	11/04/2025	11/08/2025											
Período:	%	5,87%	0,00%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%
Acumulado:	R\$	134.509,43	-	119.811,49	119.811,49	119.811,49	119.811,49	119.811,49	119.811,49	119.811,25	119.811,24	119.811,30	119.811,30	119.811,30	119.811,30	119.811,30	119.811,30	119.811,30	119.811,30	119.811,30	119.811,30	119.811,00
	%	5,87%	5,87%	11,10%	16,33%	21,56%	26,79%	32,02%	37,25%	42,48%	47,71%	52,94%	52,94%	52,94%	52,94%	52,94%	52,94%	52,94%	52,94%	52,94%	52,94%	52,94%
	R\$	134.509,43	134.509,43	254.320,92	374.132,41	493.943,90	613.755,39	733.566,88	853.378,13	973.189,37	1.093.000,67	1.212.811,67	1.212.811,67	1.212.811,67	1.212.811,67	1.212.811,67	1.212.811,67	1.212.811,67	1.212.811,67	1.212.811,67	1.212.811,67	1.212.811,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDAI DO SUL

Local: **PAULO ROBERTO PEDRO:04134687985**
segunda-feira, 11 de agosto de 2025
Data

Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO PEDRO:04134687985
Dados: 2025.08.11 16:18:18 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDUARDO BRAMBILLA BAGGIO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 5063348751
ART/RRT: 1720214457510

EDUARDO BRAMBILLA BAGGIO:05885881995
Assinado de forma digital por EDUARDO BRAMBILLA BAGGIO:05885881995
Dados: 2025.08.11 16:06:15 -03'00'



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR CEF	Nº OPERAÇÃO 26094/2020	Nº SICONV 909303/2020	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Pavimentação de Estradas Vicinais no município de Jundiá do SUL -PR	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL	REPASSE 960.019,00	CONTRAPARTIDA 390.781,50	INVESTIMENTO 1.350.800,50	Nº RRE 11	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -940.310,17
--------------------------------	---	------------------------	---------------------	------------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	24000	m²	0	11	1.767,24	787,24	98,00	885,24	50,09%	
2.	TERRAPLANAGEM	Em Análise	24000	m²	0	11	28.080,00	12.480,00	1.560,00	14.040,00	50,00%	
3.	PAVIMENTACAO	Em Análise	24000	m²	0	11	2.082.193,20	925.419,20	115.677,40	1.041.096,60	50,00%	
4.	CONTENÇÃO	Em Análise	800	m²	0	11	44.560,80	19.804,80	2.475,60	22.280,40	50,00%	
5.	SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS E PAGOS	0	0		0	11	134.509,43	134.509,43	-	134.509,43	100,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(47,71%)	(5,23%)	(52,94%)	
							Repassse	960.019,00	457.988,10	50.203,08	508.191,18	
							Contrapartida	1.331.091,67	635.012,57	69.607,92	704.620,49	52,94%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	2.291.110,67	1.093.000,67	119.811,00	1.212.811,67	

Acumulado Anterior: 47,71%

Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL

Local PAULO ROBERTO
PEDRO:04134687985

Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO
PEDRO:04134687985
Dados: 2025.08.11 16:16:49 -03'00'

Representante Tomador
Nome: PAULO ROBERTO PEDRO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome:
Cargo:

segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Data EDUARDO BRAMBILLA
BAGGIO:05885881995

Assinado de forma digital por EDUARDO
BRAMBILLA BAGGIO:05885881995
Dados: 2025.08.11 16:06:43 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDUARDO BRAMBILLA BAGGIO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 5063348751
ART/RRT: 1720214457510

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

Ofício nº: 011

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDIAI DO SUL, 11 de agosto de 2025

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 11ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 26094/2020 - SICONV nº 909303/2020

Objeto: Pavimentação Poliédrica da estrada da bocaina
Proponente / Tomador: CEF

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 11ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 960.019,00	R\$ 50.203,08	R\$ 508.191,18
Contrapartida Financeira:	R\$ 1.331.091,67	R\$ 69.607,92	R\$ 704.620,49
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 2.291.110,67	R\$ 119.811,00	R\$ 1.212.811,67
Execução Física:	-	5,23%	52,94%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

PAULO ROBERTO
PEDRO:04134687985

PAULO ROBERTO PEDRO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por PAULO
ROBERTO PEDRO:04134687985
Dados: 2025.08.11 16:17:09 -03'00'

RE: CE REGOV/LD 2040/2025 - PM JUNDIAI DO SUL/PR - Providências para desbloqueio de recursos do CR 909303 - OBTV

De odair farinha <odairfarinha@hotmail.com>
Data Qua, 03/09/2025 16:39
Para REGOVL03 - Repasse OGU <regovld03@caixa.gov.br>

Boa tarde

Conforme, orientado abaixo.... ja realizamos as devidas providencias abaixo elencadas e aguardamos a autorização para pagamanto.

att

Odair

De: REGOVL03 - Repasse OGU <regovld03@caixa.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 29 de agosto de 2025 15:55
Para: eduardobaggio@gmail.com <eduardobaggio@gmail.com>; odairfarinha@hotmail.com <odairfarinha@hotmail.com>; planoscontabil@hotmail.com <planoscontabil@hotmail.com>
Assunto: CE REGOV/LD 2040/2025 - PM JUNDIAI DO SUL/PR - Providências para desbloqueio de recursos do CR 909303 - OBTV

E-mail classificado como #PUBLICO

CE REGOV/LD 2040/2025

Londrina, 29 de agosto de 2025

A Sua Excelência o Senhor
PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL - PR

Assunto : Providências para desbloqueio de recursos - OBTV
Ref. : Contrato de Repasse OGU nº. 909303/2020/MIDR/CAIXA
Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano - Execução de
pavimentação de estradas vicinais no município de Jundiá do Sul -PR

Excelentíssimo Senhor,

1 Informamos a realização da vistoria CAIXA atestando a execução de **52,94%** do objeto

contratado, o que corresponde **à necessidade do depósito de contrapartida** no valor de R\$ 71.840,84 (setenta e um mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos), mediante transferência ou depósito na conta 0405.006.00647136-7.

1.1 Salientamos o seguinte apontamento técnico para atendimento até a próxima vistoria:
Adequação da placa de obra.

2 Por se tratar de contrato que opera por **OBTV, como condição para desbloqueio** o conveniente/tomador deverá providenciar no sistema TRANSFEREGOV:

a) Classificação da contrapartida;

b) Inserção da Nota Fiscal na aba *Documento de Liquidação*, com o rateio abaixo informado (*destacamos que a nota deverá conter em sua via original o número do contrato de repasse/convênio, nome do Órgão Gestor e Programa*);

c) Emissão do relatório de execução denominado "*Documentos de Liquidação Incluídos*" (*Obs.: as guias de tributos a serem lançadas deverão ser inseridas antes de sua geração*).

Repasse OGU	Rendimentos	Contrapartida	Total
R\$ 47.970,16	R\$ 0,00	R\$ 71.840,84	R\$ 119.811,00

2.1 Após a conclusão de todos os procedimentos acima via e-mail regovld03@caixa.gov.br, para que possamos proceder ao desbloqueio financeiro.

2.2 **Aguardar autorização da REGOV/LD para a realização do pagamento.**

3 Estamos à disposição para mais esclarecimentos, se necessários.

Respeitosamente,

Lilian Mostasso


Assistente

Representação da Gerência Executiva de Governo Londrina/PR

Messias Anacleto Rosa Junior

Coordenador de Filial

Representação da Gerência Executiva de Governo Londrina/PR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 02/09/2025	Número do RPS	Número da nota 286
	Data da emissão da nota 01/09/2025 12:34:21	
	Data do fato gerador 01/09/2025 12:34:21	
	Código de verificação WPKH3RBPB	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ALMEIDA SERVIÇOS
 Nome/Razão social: VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME
 CPF/CNPJ: 16.642.296/0001-84 Inscrição municipal: 5085
 Endereço: R GUILHERME HERTEL Número: 67 Bairro: VILA SANTO ANDRE CEP: 84200-000
 Complemento:
 Município: Jaguariáiva UF: PR
 E-mail: contecservicos@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (43) 3535-3078
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JUNDIAI DO SUL PREF GABINETE DO PREFEITO
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL
 CPF/CNPJ: 76.408.061/0001-54 Inscrição municipal:
 Endereço: PC PIO X Número: 260 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Jundiá do Sul UF: PR
 E-mail: Inscrição estadual:
 Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PEDRAS IRREGULARES, COMPREENDENDO A EVOLUÇÃO DA 11ª MEDIÇÃO EM 5,23% DO OBJETO CONTRATADO, CONFORME RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO ç RRE. TOTAL EXECUTADO NO PERÍODO DE 12/04/2025 a 11/08/2025 1200,00M² - 52,94% DO TOTAL DO CONTRATO. DADOS ADICIONAIS: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONTRATO DE REPASSE OGU Nº. 909303/2020/MIDR/CAIXA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2023 CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº. 127/2023 ORDEM DE SERVIÇO - 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SICREDI - AGENCIA: 0753 - CONTA CORRENTE: 00012808-4 . REPASSE UNIÃO: R\$71.840,84	71.840,8400	1,0000	71.840,8400	71.840,84x3,00=	2.155,23

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	69.685,61								


RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 71.840,84		Valor líquido = R\$ 69.685,61			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	71.840,84	2.155,23

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 02/09/2025	Número do RPS	Número da nota 286
	Data da emissão da nota 01/09/2025 12:34:21	
	Data do fato gerador 01/09/2025 12:34:21	
	Código de verificação WPKH3RBPB	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ALMEIDA SERVIÇOS
 Nome/Razão social: VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME
 CPF/CNPJ: 16.642.296/0001-84 Inscrição municipal: 5085
 Endereço: R GUILHERME HERTEL Número: 67 Bairro: VILA SANTO ANDRE CEP: 84200-000
 Complemento:
 Município: Jaguariáiva UF: PR
 E-mail: contecservicos@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (43) 3535-3078
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JUNDIAI DO SUL PREF GABINETE DO PREFEITO
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL
 CPF/CNPJ: 76.408.061/0001-54 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: PC PIO X Número: 260 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Jundiá do Sul UF: PR
 E-mail: Telefone: Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Jundiá do Sul

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3%
 Situação desta NFS-e: Retida
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 9.662,59 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.844,90 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Comprovante de pagamento

01 SET 2025 - 14:26:02

Valor R\$ 2.155,23

III Destino

Favorecido PREF MUNICIPAL DE JUNDIAI DO S

Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Vencimento 01 SET 2025

Código de barras 748911032515
637307172091
765210125119
10000215523

Origem

Pagador VALDECIR RODRIGUES SIMAO

Banco Nu Pagamentos S.A

Agência 0001

Conta 75585392-9

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 68b5d729-e516-47af-
b600-91d3ccde3d5f

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

Caso necessite de atendimento, acesse o [Me ajuda](#) →

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h
às 18h em dias úteis).

fechar X

Loading Image...

Usuário:PAULO ROBERTO PEDRO

CPF:041.346.879-85

17/09/2025 15:04:17 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Instrumento](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 909303

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados Gerais

Código do Instrumento	909303
Modalidade	CONTRATO DE REPASSE
Data Início de Vigência	31/12/2020
Data Fim de Vigência	28/02/2026
Razão Social do Concedente	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Razão Social do Convenente	MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL

Dados Financeiros

Total de Recursos	R\$ 2.291.110,67
Recursos de Repasse da União	R\$ 960.019,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 1.331.091,67

Domicílio Bancário

Tipo da Conta	Corrente/poupança - TV
Banco	104
Agência	0405
Conta	0066471367

[Voltar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário:PAULO ROBERTO PEDRO

CPF:041.346.879-85

17/09/2025 15:05:17 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Instrumento](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)


Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 909303

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação *	286 - VALDECIR RODRIGUES SIMAO
Tipo de Pagamento	<input checked="" type="radio"/> Pagamento Total <input type="radio"/> Pagamento Parcial 
Valor Original	R\$ 71.840,84
Valor Líquido Atual	R\$ 71.840,84
Tipo	NOTA FISCAL
Data de Emissão	01/09/2025

Favorecido

CNPJ/CPF/IG	16.642.296/0001-84
Nome/Razão Social	VALDECIR RODRIGUES SIMAO

Domicílio Bancário do Favorecido

Tipo da Conta	Corrente/poupança - Favorecido
Banco	748
Agência	0753
Conta	128084

Processo de Execução

Número	5/2023
Modalidade	TOMADA_PRECOS

Contrato Vinculado

Data de Assinatura

Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PEDRAS IRREGULARES, COMPREENDENDO A EVOLUÇÃO DA 11ª MEDIÇÃO EM 5,23% DO OBJETO CONTRATADO, CONFORME RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO e RRE. TOTAL EXECUTADO NO PERÍODO DE 12/04/2025 a 11/08/2025 1200,00M² - 52,94% DO TOTAL DO CONTRATO. DADOS ADICIONAIS: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONTRATO DE REPASSE OGU Nº. 909303/2020/MIDR/CAIXA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2023 CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº. 127/2023 ORDEM DE SERVIÇO - 2023	71.840,84	1	71.840,84

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	71.840,84

Tributos

Não há registros a exibir.

Contribuições

Não há registros a exibir.

Outras Retenções

Não há registros a exibir.

fechar X

Loading Image...

Usuário:PAULO ROBERTO PEDRO

CPF:041.346.879-85

11/09/2025 15:05:17 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Instrumento](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 909303

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	9857154	
Data	11/09/2025	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 71.840,84	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 71.840,84	
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00	
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 71.840,84	

Observação *

REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF N 286/2025 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PEDRAS IRREGULARES.

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 71.840,84

Meta Atendida	Etapas Atendidas	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL	0,00	71.840,84	0,00

fechar X

Loading Image...

Usuário:PAULO ROBERTO PEDRO

CPF:041.346.879-85

11/09/2025 15:05:17 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 909303

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados da OBTV de Inclusão

UG Emitente	458856
Gestão Emitente	44444
Nr. da OBTV	2025OB000006
Data da Inclusão da OBTV	11/09/2025
Número Bancário	04579202
Data de Envio do SIAFI	11/09/2025 14:51:53

Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Incluído	EUNICE PAULINA FERREIRA	11/09/2025 13:11:53
Autorizado pelo Gestor Financeiro	EUNICE PAULINA FERREIRA	11/09/2025 13:16:35
Autorizado pelo Ordenador de Despesas	PAULO ROBERTO PEDRO	11/09/2025 14:51:53

Situação Atual do Pagamento

Situação Atual do Registro de Pagamento	Movimentação Financeira Concluída
Nome do Responsável	PAULO ROBERTO PEDRO
Data/Hora da Situação	11/09/2025 14:51:53

[Voltar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário:PAULO ROBERTO PEDRO

CPF:041.346.879-85

17/09/2025 15:05:17 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL


Instrumento 909303

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Tabela de Anexos do Pagamento

Não há registros a exibir.

[Voltar](#)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 02/09/2025	Número do RPS	Número da nota 287
	Data da emissão da nota 01/09/2025 12:35:57	
	Data do fato gerador 01/09/2025 12:35:57	
	Código de verificação QG5RHAAIK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ALMEIDA SERVIÇOS
 Nome/Razão social: VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME
 CPF/CNPJ: 16.642.296/0001-84 Inscrição municipal: 5085
 Endereço: R GUILHERME HERTEL Número: 67 Bairro: VILA SANTO ANDRE CEP: 84200-000
 Complemento:
 Município: Jaguariáiva UF: PR
 E-mail: contecservicos@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (43) 3535-3078
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JUNDIAI DO SUL PREF GABINETE DO PREFEITO
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL
 CPF/CNPJ: 76.408.061/0001-54 Inscrição municipal:
 Endereço: PC PIO X Número: 260 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Jundiá do Sul UF: PR
 E-mail: Inscrição estadual:
 Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PEDRAS IRREGULARES, COMPREENDENDO A EVOLUÇÃO DA 11ª MEDIÇÃO EM 5,23% DO OBJETO CONTRATADO, CONFORME RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO ç RRE. TOTAL EXECUTADO NO PERÍODO DE 12/04/2025 a 11/08/2025 1200,00M² - 52,94% DO TOTAL DO CONTRATO. DADOS ADICIONAIS: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONTRATO DE REPASSE OGU Nº. 909303/2020/MIDR/CAIXA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2023 CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº. 127/2023 ORDEM DE SERVIÇO - 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SICREDI - AGENCIA: 0753 - CONTA CORRENTE: 00012808-4 . REPASSE UNIÃO: R\$47.970,16	47.970,1600	1,0000	47.970,1600	47.970,16x3,00=	1.439,10

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	46.531,06								


RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 47.970,16		Valor líquido = R\$ 46.531,06			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	47.970,16	1.439,10

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 02/09/2025	Número do RPS	Número da nota 287
	Data da emissão da nota 01/09/2025 12:35:57	
	Data do fato gerador 01/09/2025 12:35:57	
	Código de verificação QG5RHAAIK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ALMEIDA SERVIÇOS
 Nome/Razão social: VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME
 CPF/CNPJ: 16.642.296/0001-84 Inscrição municipal: 5085
 Endereço: R GUILHERME HERTEL Número: 67 Bairro: VILA SANTO ANDRE CEP: 84200-000
 Complemento:
 Município: Jaguariaíva UF: PR
 E-mail: contecservicos@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (43) 3535-3078
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JUNDIAI DO SUL PREF GABINETE DO PREFEITO
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL
 CPF/CNPJ: 76.408.061/0001-54 Inscrição municipal:
 Endereço: PC PIO X Número: 260 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Jundiá do Sul UF: PR
 E-mail: Telefone: Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Jundiá do Sul

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3%
 Situação desta NFS-e: Retida
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6.451,99 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.899,62 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Comprovante de pagamento

01 SET 2025 - 14:37:12

Valor R\$ 1.439,10

III Destino

Favorecido PREF MUNICIPAL DE JUNDIAI DO S

Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Vencimento 01 SET 2025

Código de barras 748911032515
638107175091
765210793119
10000143910

Origem

Pagador VALDECIR RODRIGUES SIMAO

Banco Nu Pagamentos S.A

Agência 0001

Conta 75585392-9

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 68b5d9c7-169c-42b7-bc39-
a47d3b4c7cf5

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

Caso necessite de atendimento, acesse o [Me ajuda](#) →

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h
às 18h em dias úteis).


fechar X

Loading Image...

Usuário:PAULO ROBERTO PEDRO

CPF:041.346.879-85

11/07/2025 15:08:17 Sair do Sistema



Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Instrumento 909303

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados Gerais

Código do Instrumento	909303
Modalidade	CONTRATO DE REPASSE
Data Início de Vigência	31/12/2020
Data Fim de Vigência	28/02/2026
Razão Social do Concedente	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Razão Social do Convenente	MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL

Dados Financeiros

Total de Recursos	R\$ 2.291.110,67
Recursos de Repasse da União	R\$ 960.019,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 1.331.091,67

Domicílio Bancário

Tipo da Conta	Corrente/poupança - TV
Banco	104
Agência	0405
Conta	0066471367

[Voltar](#)


fechar X

Loading Image...

Usuário:PAULO ROBERTO PEDRO

CPF:041.346.879-85

11/09/2025 15:09:17 Sair do Sistema



Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 909303

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação *	287 - VALDECIR RODRIGUES SIMAO
Tipo de Pagamento	<input checked="" type="radio"/> Pagamento Total <input type="radio"/> Pagamento Parcial
Valor Original	R\$ 47.970,16
Valor Líquido Atual	R\$ 47.970,16
Tipo	NOTA FISCAL
Data de Emissão	01/09/2025

Favorecido

CNPJ/CPF/IG	16.642.296/0001-84
Nome/Razão Social	VALDECIR RODRIGUES SIMAO

Domicílio Bancário do Favorecido

Tipo da Conta	Corrente/poupança - Favorecido
Banco	748
Agência	0753
Conta	128084

Processo de Execução

Número	5/2023
Modalidade	TOMADA_PRECOS

Contrato Vinculado

Data de Assinatura

Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PEDRAS IRREGULARES, COMPREENDENDO A EVOLUÇÃO DA 11ª MEDIÇÃO EM 5,23% DO OBJETO CONTRATADO, CONFORME RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO e RRE. TOTAL EXECUTADO NO PERÍODO DE 12/04/2025 a 11/08/2025 1200,00M² - 52,94% DO TOTAL DO CONTRATO. DADOS ADICIONAIS: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONTRATO DE REPASSE OGU Nº. 909303/2020/MIDR/CAIXA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2023 CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº. 127/2023 ORDEM DE SERVIÇO - 2023	47.970,16	1	47.970,16

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	47.970,16

Tributos

Não há registros a exibir.

Contribuições

Não há registros a exibir.

Outras Retenções

Não há registros a exibir.


fechar X

Loading Image...

Usuário:PAULO ROBERTO PEDRO

CPF:041.346.879-85

11/09/2025 15:09:17 Sair do Sistema



Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 909303

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	9857157	
Data	11/09/2025	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 47.970,16	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 47.970,16	
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00	
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 47.970,16	

Observação *

REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF N 287/2025 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PEDRAS IRREGULARES.

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 47.970,16

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL	47.970,16	0,00	0,00


fechar X

Loading Image...

Usuário:PAULO ROBERTO PEDRO

CPF:041.346.879-85

11/09/2025 15:15:07 Sair do Sistema



Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 909303

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados da OBTV de Inclusão

UG Emitente	458856
Gestão Emitente	44444
Nr. da OBTV	2025OB000005
Data da Inclusão da OBTV	11/09/2025
Número Bancário	04579201
Data de Envio do SIAFI	11/09/2025 14:51:52

Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Incluído	EUNICE PAULINA FERREIRA	11/09/2025 13:12:56
Autorizado pelo Gestor Financeiro	EUNICE PAULINA FERREIRA	11/09/2025 13:16:05
Autorizado pelo Ordenador de Despesas	PAULO ROBERTO PEDRO	11/09/2025 14:51:52

Situação Atual do Pagamento

Situação Atual do Registro de Pagamento	Movimentação Financeira Concluída
Nome do Responsável	PAULO ROBERTO PEDRO
Data/Hora da Situação	11/09/2025 14:51:52

Voltar


fechar X

Loading Image...

Usuário:PAULO ROBERTO PEDRO

CPF:041.346.879-85

11/07/2025 15:10:07 Sair do Sistema



Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 909303

[Instrumento](#)

[Documento de Liquidação](#)

[Detalhes do Pagamento](#)

[Histórico](#)

[Anexos](#)

Tabela de Anexos do Pagamento

Não há registros a exibir.

[Voltar](#)



CE REGOV/LD /2025 - PM JUNDIAI DO SUL/PR - Desbloqueio de recursos OGU – CR 909303

De REGOVL03 - Repasse OGU <regovld03@caixa.gov.br>

Data Ter, 09/09/2025 12:29

Para eduardobaggio@gmail.com <eduardobaggio@gmail.com>; odairfarinha@hotmail.com <odairfarinha@hotmail.com>; planoscontabil@hotmail.com <planoscontabil@hotmail.com>

E-mail classificado como #PUBLICO

CE REGOV/LD 2102/2025

Londrina, 09 de setembro de 2025

A Sua Excelência o Senhor
PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL - PR

Assunto: Desbloqueio de Recursos

Ref. : Contrato de Repasse OGU nº 909303/2020/MIDR/CAIXA

Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano - Execução de pavimentação de estradas vicinais no município de Jundiá do Sul -PR

Excelentíssimo Senhor

1 Notificamos o desbloqueio de recursos financeiros nesta data no valor de **R\$47.970,16** (quarenta e sete mil, novecentos e setenta reais e dezesseis centavos), que somados à contrapartida financeira de **R\$71.840,84** (setenta e um mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos), perfazem o total de **R\$119.811,00** (cento e dezenove mil e oitocentos e onze reais), a ser pago à empresa **VALDECIR RODRIGUES SIMAO – CNPJ 16.642.296/0001-84, referente às Notas Fiscais nº 286 e nº 287.**

2 O(s) pagamento(s) decorrente(s) deste Contrato de Repasse deverá(ão) ser efetuado(s) somente por meio de Ordem Bancária de Transferência Voluntária – OBTV no Sistema Plataforma TransfereGov, de acordo com o que foi regulamentado pelo Decreto n. ° 7.641, de 12/12/2011.

2.1 A opção Consultar Domicílio Bancário do Credor deverá ser utilizada antes da Inclusão do Documento de Liquidação e do Pagamento com OBTV, como também antes da opção Cadastrar Credor da Transferência Voluntária.

2.1.1 Se não existir o Credor/Fornecedor e/ou o domicílio bancário a ser usado na inclusão do documento de liquidação, deverá ser utilizada a opção “Cadastrar Credor da Transferência Voluntária” do menu execução - *cadastrar credor permite ao conveniente cadastrar o fornecedor/credor e seu domicílio bancário (banco, agência e conta bancária) no SIAFI*. Depois de registrado o

domicílio bancário, o usuário com o perfil de Ordenador de Despesa OBTV deverá autorizar e enviar ao SIAFI o domicílio bancário do fornecedor.

2.1.2 Após a aprovação e envio ao SIAFI do domicílio bancário, o usuário com o perfil de Gestor Financeiro do Conveniente poderá registrar o Documento de Liquidação e preparar os pagamentos com OBTV:

- **OBTV – Pagamento a Fornecedor;**

- **OBTV Tributos (utilizado apenas para o pagamento dos tributos informados no documento de liquidação e retidos em um pagamento com OBTV concluído ou conciliado).**

2.1.2.1 Especificamente quanto ao pagamento dos tributos (OBTV Tributos), deverá ser informado uma conta qualquer em nome do **Conveniente - que não seja a conta do convênio** - para que o tributo possa ser efetivamente quitado a partir dessa.

2.2 Concluídos todos esses trâmites, então deverá ser gerado e enviado para análise da Concedente o relatório de execução denominado “**Pagamentos Realizados**” para a comprovação da execução financeira desta etapa desbloqueada.

2.3 Demais instruções encontram-se listadas no manual denominado “**Convênio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria operados por OBTV - Perfil Conveniente**”, disponibilizado no Portal dos Convênios, opção “**Manuais**”.

3 Favor retornar esta mensagem à REGOV Londrina assim que todos os passos estejam concluídos.

4 Estamos à disposição para mais esclarecimentos, se necessários.

Respeitosamente,

Lilian Mostasso
Assistente
(43) 3043-0256

Messias Anacleto Rosa Junior
Coordenador de Filial
Representação Executiva de Governo Londrina/PR



TED

Debitado

Agência 652-1
Conta corrente 8537-5 P M JUND SUL FUNDO ESPECI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 405 STO ANTONIO DA PLATINA
Conta corrente (com DV) 6471367
Conta Pagamento 0000
CNPJ 76.408.061/0001-54
Nome favorecido MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 71.840,84
Data transferência 01/09/2025
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 424229317.

Usuário: JI626910 PAULO ROBERTO PEDRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax:(43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP86470-000-Jundiá do Sul-Paraná

E-mail – prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME

CNPJ: 16.642.296/0001-84

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2023

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES DE ESTRADA RURAL PRIMARIA

Fotos referente aos serviços executados no
período de 12/04/205 a 11/08/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax:(43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP86470-000-Jundiá do Sul-Paraná

E-mail – prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br

Foto: 1



Placa Obra

Latitude: -23.424273

Longitude: -50.256288 Data: 12/08/2025

Foto: 2



Placa Obra

Latitude: -23.426743

Longitude: -50.255693 Data: 12/08/2025

Foto: 3



Pavimentação Poliédrica Jundiá do Sul

Latitude: -23.411667

Longitude: -50.253898 Data: 12/08/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax:(43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP86470-000-Jundiá do Sul-Paraná

E-mail – prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br

Foto: 4




Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul

Latitude: -23.411667

Longitude: -50.253898 Data: 12/08/2025

Foto: 5

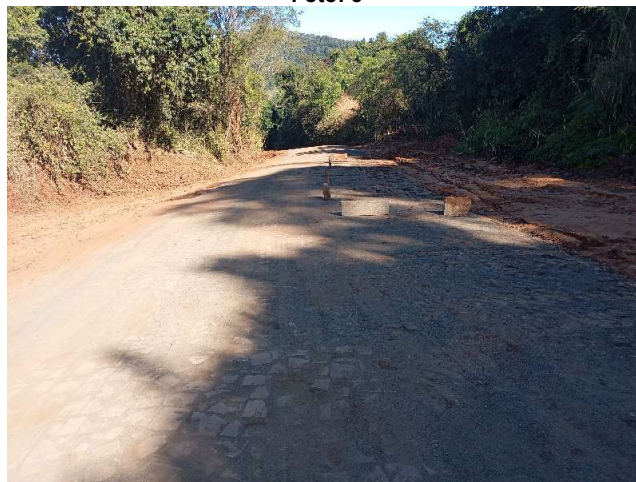

Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul

Latitude: -23.41158 Longitude: -50.252723

Data:12/08/2025

Foto: 6



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul

Latitude:-23.4116 Longitude:-50.252933

Data:12/08/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax:(43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP86470-000-Jundiá do Sul-Paraná

E-mail – prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br

Foto: 7



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul
Latitude: -23.41159 Longitude: -50.252959
Data: 12/08/2025

Foto: 8



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul
Latitude: -23.41159 Longitude: -50.252959
Data: 12/08/2025

Foto: 9



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul
Latitude: -23.41159 Longitude: -50.252959
Data: 12/08/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax:(43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP86470-000-JundiádoSul-Paraná

E-mail –prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br

Foto: 10



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul

Latitude:-23.41159 Longitude:-50.252959

Data:12/08/2025

Foto: 11



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul

Latitude:-23.411605 Longitude:-50.253221

Data:12/08/2025

Foto: 12



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul

Latitude:-23.411605 Longitude:-50.253221

Data:12/08/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax:(43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP86470-000-JundiádoSul-Paraná

E-mail –prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br

Foto: 13



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul
Latitude:-23.411605 Longitude:-50.253221
Data:12/08/2025

Foto: 14



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul
Latitude: -23.411605 Longitude: -50.253221
Data:12/08/2025

Foto: 15



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul
Latitude: -23.411605 Longitude: -50.253221
Data:12/08/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax:(43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP86470-000-JundiádoSul-Paraná

E-mail –prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br

Foto: 16



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul
Latitude: -23.411605 Longitude: -50.253221
Data:12/08/2025

Foto: 17



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul
Latitude: -23.411605 Longitude: -50.253221
Data:12/08/2025

Foto: 18



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul
Latitude: -23.411605 Longitude: -50.253221
Data:12/08/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax:(43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP86470-000-Jundiá do Sul-Paraná

E-mail – prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br

Foto: 19



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul
Latitude: -23.411605 Longitude: -50.253221
Data:12/08/2025

Foto: 20



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul
Latitude: -23.411793 Longitude: -50.254289
Data:12/08/2025

Foto: 21



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul
Latitude: -23.411793 Longitude: -50.254289
Data:12/08/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax:(43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP86470-000-Jundiá do Sul-Paraná

E-mail – prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br

Foto: 22



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul
Latitude: -23.411793 Longitude: -50.254289
Data:12/08/2025

Foto: 23



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul
Latitude: -23.411931 Longitude: -50.254527
Data:12/08/2025

Jundiá do Sul, 12 de agosto de 2025

PAULO ROBERTO PEDRO
Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO PEDRO:0413468795
Dados: 2025.08.12 12:58:34 -03'00'

PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito

Alexandre Augusto Ormeneze
Assinado de forma digital por Alexandre Augusto Ormeneze
Dados: 2025.08.12 13:25:43 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE
ARQUITETO



Documento assinado digitalmente
SILVIA APARECIDA OTAVIO
Data: 12/08/2025 14:33:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SILVIA APARECIDA OTAVIO
Diretora do Departamento Municipal de Agricultura
